Befundaussteller:

EXPERT Pinetz GmbH - Elektroinstallationen
7132 Frauenkirchen, Tadtnerweg 1

Befund-Elektro

Befund Nr.: PinFrk21015

gem. Elektrotechnikgesetz

Anlagenadresse: 7132, Frauenkirchen, Hauptstrasse 12
PLZ, Ort | Strasse, Nr. | Telefon Nr.

Anlagenbetreiber: **Mag. KAINTZ Dietmar**
Zuname/Firma

7132, Frauenkirchen | Hauptstrasse 12 | 0699/17701970
PLZ, Ort | Strasse, Nr. | Telefon Nr.

Überprüfte Anlage/Anlagenteile: ***Gesamte Anlage (Wohnung 1, Wohnung 2, Verkauf, Werkstatt, Lager, Keller)***

Umfang der Überprüfung:

Überprüft wurde die gesamte Anlage ohne Blitzschutz nach ÖVE E 8001-6-63

Das Prüfprotokoll wurde lt. Bestandsplänen ausgeführt

Dieser Befund dient als Außerordentliche Prüfung

Der Befund umfasst insgesamt 17 Seiten mit folgenden Beiblättern
1. Anlagenbuch
2. Messprotokolle

Zusammenfassung der Prüfergebnisse: **Die Anlage ist in Ordnung**

Datum der Überprüfung: 01.03.2021 Datum der nächsten Überprüfung: -

Name der prüfenden Firma: EXPERT PINETZ GES M B H
Name des Prüfers: Nagy D. Schaden B.

Dieser Befund wurde von einem befugten Gewerbetreibenden verfasst und basiert auf den nach dem Elektrotechnikgesetz gültigen Normen und Vorschriften. Der Befund beinhaltet die aus den Beilagen ersichtlichen Ergebnisse der Besichtigung, Messungen und Prüfungen. Dieser Befund wurde gemäß den geltenden ÖVE-Vorschriften hinsichtlich der Dokumentation des Anlagenbuches, der Erst- und der Wiederkehrenden Prüfung erstellt. Dieses Formular enthält alle Bestimmungen, die auch das bundesweit einheitliche Formular (Prüfbefund - bundeseinheitliche Fassung über eine elektrotechnische Anlagen basierend auf SNT-Vorschriften) vorsieht

Frauenkirchen am 15.04.2021 — Datum/Ort

Ing.E.Pinetz — Stempel/Unterschrift

EXPERT PINETZ GMBH
7132 Frauenkirchen
Tadtnerweg 1, Tel.02172/3207
ATU 21029303

Vorliegende Prüfergebnisse wurden vom Anlagenverantwortlichen zur Kenntnis genommen:

Frauenkirchen am

Ort/Datum — Name — Stempel/Unterschrift

1. Anlagenbuch: Elektrotechnische Anlage

Anlageninhaber:	Mag. KAINTZ Dietmar	zu Befund Nr.:	PinFrk21015
Anlagenadresse:	7132, Frauenkirchen, Hauptstrasse 12	Ausstelldatum:	15.04.2021
Überprüfte Anlage Anlagenteil:	Gesamte Anlage (Wohnung 1, Wohnung 2, Verkau		

1.a Allgemeine Angaben

Netzbetreiber: Netz Burgenland

Art des Betriebes/Anlage: Wohnung / Geschäftslokal
(Haus/Wohnung, Gewerbe, Handel, Industrie, Landwirtschaft, Sonstiges .....)

Datum der Errichtung: nicht Bekannt (Teilweise Sanierung 2021)

1.b Elektrische Energieversorgung

Zuleitung E-AY2Y 4x50mm²

Absicherung 63A

Zählerkasten 4 NV (Saniert 2021)

siehe Anhang : Verteilerschema

1.c Verteiler

Hauptverteiler: Zählerkasten siehe oben

Unterverteiler : UV Wohnung hinten

Angew. Schutzmaßname Nullung mit FI Zusatzschutz

1.d Leitung(en) in/auf zugehörigen Tragsystemen:

YE im FX Rohr UP und YM im Rohr AP

1.e Bestandspläne:

Die einzelnen Messungen wurden lt. Bestandsplänen vom jeweiligen Datum der Überprüfung durchgeführt

siehe Anhang :

1.c.1 Anlagenbuch: Verteiler

Anlageninhaber: Mag. KAINTZ Dietmar
Anlagenadresse: 7132, Frauenkirchen, Hauptstrasse 12
01.03.2021 Gesamte Anlage (Wohnung 1, Wohnung 2, Verkauf, V

zu Befund Nr.: PinFrk21015
Ausstelldatum: 15.04.2021

Verteilerschema:

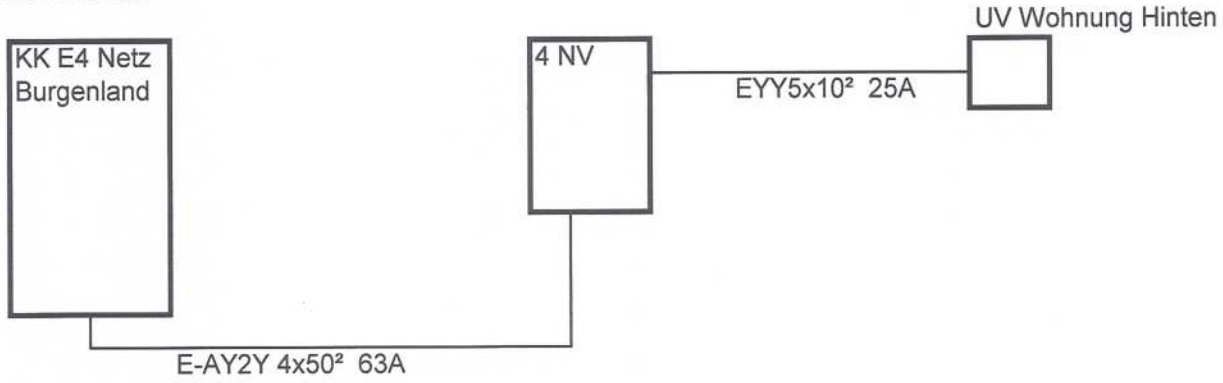

2.Messprotokolle:

Anlageninhaber:	Mag. KAINTZ Dietmar	Zu Befund Nr.:	PinFrk21015
Anlagenadresse:	7132, Frauenkirchen, Hauptstrasse 12	Ausstelldatum:	15.04.2021
Überprüfte Anlage/ Anlagenteile	Gesamte Anlage (Wohnung 1, Wohnung 2, Ve		

2 Messung

Verwendete Prüfmittel bzw. Messgeräte:

Hersteller:	Fluke	Typ:	1654 B	Seriennummer:	V3.14/3.13 2654003
Hersteller:		Typ:		Seriennummer:	

2.a Messung der Betriebsspannung an den Netzausläufern:

Minimalwerte: L/N 236 V L/L 405 V

2.b Messung an der Erdungsanlage:

gemessen an: Erdungsklemme im Verteiler

Erdungswiderstand: Ra: Ω

an die Potschiene sind angeschlossen: Erdungsanlage
Verteiler

2.c Messung der Fehlerschutzmaßnahme Nullung

im ungünstigsten Fall:	Schleifenwiderstand	Zs (Rsch):	2,86	Ω
	Kurzschlussstrom	Ik:	81	A
zugehörige vorgeschaltete Leitungsschutzeinrichtung:			16	A
		m(k) Faktor	5	

siehe Anhang: 2.d.1 Schuko und FI Messung

Schutzmaßnahme ist in Ordnung

2.d Messung Zusatzschutz FI-Schutzschaltung

Aus der Anwendung ergibt sich ein gemessenes Uf (Ufl) im ungünstigsten Fall bei:

gemessen mit 50V Uf:	1	V AC
Auslösezeit ta:	7,6	ms
Auslösestrom Ia:	24	mA AC

siehe Anhang: 2.d.1 Schuko und FI Messung

Schutzmaßnahme ist in Ordnung

Prüfung, Erprobung und Messung: Elektrische Anlage

Zu Befund Nr.: PinFrk21015
Ausstelldatum: 15.04.2021

Anlageninhaber: Mag. KAINTZ Dietmar
Anlagenadresse: 7132, Frauenkirchen, Hauptstrasse 12
Überprüfte Anlage/
Anlagenteil: Gesamte Anlage (Wohnung 1, Wohnung 2, Verkauf, V

2.e Messung der Fehlerschutzmaßnahme Schutztrennung

Für mehrere Betriebsmittel gemessen auf Konstanthalter im KG.N.HV

Primärspannung des Trafos:	U_{prim}:		V
Sekundärspannung des Trafos:	U_{sek}:		V
R_{isol} gegen andere Anlagenstromkreise:	R_{isol}:		MΩ

Schutzmaßnahme ist nicht vorhanden

2.f Messung des Isolationswiderstandes in trockenen und feuchten Räumen

Prüfspannung $U_{prüf}$: 500 V Leitungslänge: max.100 m

siehe Anhang: 2.d.1 Schuko und FI Messung

1.Minimalwerte

L1/PE	2,79 MΩ	L2/PE	2,76 MΩ	L3/PE	2,78 MΩ
				N/PE	2,8 MΩ

Schutzmaßnahme ist in Ordnung

2.g Messungen des Drehfeldes

an der netzseitigen Anspeisung

Drehfeld ist in Ordnung

2.d.1 Messprotokolle: Schuko und FI Messungen

Anlageninhaber:	Mag. KAINTZ Dietmar
Anlagenadresse:	7132, Frauenkirchen, Hauptstrasse 12
Überprüfte Anlage	
Anlagenteile:	Gesamte Anlage (Wohnung 1, Wohnung 2, Verkauf, Werks
Messgerät:	FLUKE 1654B V3.14/3.13 2654003

Zu Befund Nr.: PinFrk21015
Ausstelldatum: 15.04.2021

FLUKE MESSUNGEN

	Beschreibung		Ort		Primär	Test-bedingungen				Ergebnisse	Sekundär	Ergebnisse	Zeitstempel
	Hauptverteiler - Wohnung												
	E-Herd Wohnung EG												
1		1	1	1	Leitungsimpedanz	L-N				0,82 Ohm	PSC	283 A AC	01.03.2021 12:59
2		1	1	2	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		1,09 Ohm	PEFC	213 A AC	01.03.2021 13:00
	Licht EG												
3		1	4	1	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		0,64 Ohm	PEFC	358 A AC	01.03.2021 12:43
4		1	4	2	Leitungsimpedanz	L-N				0,55 Ohm	PSC	416 A AC	01.03.2021 12:44
5		1	4	3	Leitungsimpedanz	L-N				0,62 Ohm	PSC	370 A AC	01.03.2021 12:46
6		1	4	4	Leitungsimpedanz	L-N				0,90 Ohm	PSC	253 A AC	01.03.2021 12:50
7		1	4	5	Leitungsimpedanz	L-N				0,76 Ohm	PSC	305 A AC	01.03.2021 12:51
8		1	4	6	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		0,86 Ohm	PEFC	269 A AC	01.03.2021 12:51
9		1	4	7	Leitungsimpedanz	L-N				0,87 Ohm	PSC	266 A AC	01.03.2021 13:06
	Licht Keller + Heizung												
10		1	5	1	Leitungsimpedanz	L-N				0,80 Ohm	PSC	290 A AC	01.03.2021 13:27
11		1	5	2	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		0,76 Ohm	PEFC	306 A AC	01.03.2021 13:28
12		1	5	3	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		0,91 Ohm	PEFC	255 A AC	01.03.2021 13:29
13		1	5	4	Leitungsimpedanz	L-N				0,91 Ohm	PSC	256 A AC	01.03.2021 13:29
14		1	5	5	Leitungsimpedanz	L-N				0,72 Ohm	PSC	323 A AC	01.03.2021 13:30
15		1	5	6	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		0,72 Ohm	PEFC	323 A AC	01.03.2021 13:30
16		1	5	7	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		0,81 Ohm	PEFC	287 A AC	01.03.2021 13:30
17		1	5	8	Leitungsimpedanz	L-N				0,73 Ohm	PSC	318 A AC	01.03.2021 13:30
18		1	5	9	Leitungsimpedanz	L-N				0,54 Ohm	PSC	430 A AC	01.03.2021 13:30
19		1	5	10	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		0,65 Ohm	PEFC	358 A AC	01.03.2021 13:30
	Reserve												
20		1	6	1	Leitungsimpedanz	L-N				0,70 Ohm	PSC	329 A AC	01.03.2021 13:25
21		1	6	2	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		0,70 Ohm	PEFC	328 A AC	01.03.2021 13:27

Anlageninhaber:	Mag. KAINTZ Dietmar
Anlagenadresse:	7132, Frauenkirchen, Hauptstrasse 12
Überprüfte Anlage Anlagenteile:	Gesamte Anlage (Wohnung 1, Wohnung 2, Verkauf, Werks
Messgerät:	FLUKE 1654B V3.14/3.13 2654003

Zu Befund Nr.: PinFrk21015
Ausstelldatum: 15.04.2021

FLUKE MESSUNGEN

	Beschreibung		Ort		Primär	Test-bedingungen				Ergebnisse	Sekundär	Ergebnisse	Zeitstempel
22		1	6	3	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		0,62 Ohm	PEFC	374 A AC	01.03.2021 13:27
23		1	6	4	Leitungsimpedanz	L-N				0,58 Ohm	PSC	400 A AC	01.03.2021 13:27
	GSP												
24	SSD	1	7	1	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		0,78 Ohm	PEFC	297 A AC	01.03.2021 13:05
	Mikro												
25	SSD	1	8	1	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		0,79 Ohm	PEFC	293 A AC	01.03.2021 13:04
	Küche, Speis, WC												
26	SSD	1	9	1	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		0,81 Ohm	PEFC	285 A AC	01.03.2021 12:55
27	SSD	1	9	2	Leitungsimpedanz	L-N				0,73 Ohm	PSC	317 A AC	01.03.2021 12:55
28	SSD	1	9	3	Leitungsimpedanz	L-N				0,69 Ohm	PSC	335 A AC	01.03.2021 12:55
29	SSD	1	9	4	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		0,79 Ohm	PEFC	292 A AC	01.03.2021 12:55
30	SSD	1	9	5	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		0,83 Ohm	PEFC	278 A AC	01.03.2021 12:56
31	SSD	1	9	6	Leitungsimpedanz	L-N				0,77 Ohm	PSC	301 A AC	01.03.2021 12:56
32	SSD	1	9	7	Leitungsimpedanz	L-N				0,83 Ohm	PSC	279 A AC	01.03.2021 12:56
33	SSD	1	9	8	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		0,95 Ohm	PEFC	243 A AC	01.03.2021 12:56
34	SSD	1	9	9	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		0,82 Ohm	PEFC	283 A AC	01.03.2021 12:56
35	SSD	1	9	10	Leitungsimpedanz	L-N				0,73 Ohm	PSC	317 A AC	01.03.2021 12:56
36	SSD	1	9	11	Leitungsimpedanz	L-N				0,73 Ohm	PSC	318 A AC	01.03.2021 12:56
37	SSD	1	9	12	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		0,80 Ohm	PEFC	290 A AC	01.03.2021 12:56
38	SSD	1	9	13	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		0,85 Ohm	PEFC	273 A AC	01.03.2021 12:57
39	SSD	1	9	14	Leitungsimpedanz	L-N				0,72 Ohm	PSC	322 A AC	01.03.2021 12:57
40	SSD	1	9	15	Leitungsimpedanz	L-N				0,73 Ohm	PSC	318 A AC	01.03.2021 12:57
41	SSD	1	9	16	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		0,88 Ohm	PEFC	264 A AC	01.03.2021 12:57
42	SSD	1	9	17	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		0,87 Ohm	PEFC	266 A AC	01.03.2021 12:57
43	SSD	1	9	18	Leitungsimpedanz	L-N				0,77 Ohm	PSC	301 A AC	01.03.2021 12:58
	Verteiler												
44	RISO 1Q1	1	9999	1	Isolation				250	>200,0 MOhm	Testspannung	260 V DC	01.03.2021 14:19
45	RISO 1Q1	1	9999	2	Isolation				250	>200,0 MOhm	Testspannung	260 V DC	01.03.2021 14:19
46	RISO 1Q1	1	9999	3	Isolation				250	>200,0 MOhm	Testspannung	260 V DC	01.03.2021 14:19

Anlageninhaber:	Mag. KAINTZ Dietmar		
Anlagenadresse:	7132, Frauenkirchen, Hauptstrasse 12	Zu Befund Nr.:	PinFrk21015
Überprüfte Anlage		Ausstelldatum:	15.04.2021
Anlagenteile:	Gesamte Anlage (Wohnung 1, Wohnung 2, Verkauf, Werks		
Messgerät:	FLUKE 1654B V3.14/3.13 2654003		

FLUKE MESSUNGEN

	Beschreibung		Ort		Primär	Test-bedingungen				Ergebnisse	Sekundär	Ergebnisse	Zeitstempel
47	RISO 1Q1	1	9999	4	Isolation				250	>200,0 MOhm	Testspannung	260 V DC	01.03.2021 14:19
48	Zuleitung	1	9999	5	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		0,43 Ohm	PEFC	540 A AC	01.03.2021 14:20
49	Zuleitung	1	9999	6	Leitungsimpedanz	L-N				0,37 Ohm	PSC	627 A AC	01.03.2021 14:20
50	FI 1Q1	1	9999	7	FI-Zeit	30 mA	x1	A	180°	7,6 ms	Fehlspannung	0 V AC	01.03.2021 14:20
51	40/4/0,03 A	1	9999	8	FI-Auslösestrom	30 mA		A	0°	21 mA AC	Fehlspannung	1 V AC	01.03.2021 14:20
	Licht 1.Stock Alt												
52		2	2	1	Leitungsimpedanz	L-N				1,05 Ohm	PSC	219 A AC	01.03.2021 13:09
53		2	2	2	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		1,12 Ohm	PEFC	205 A AC	01.03.2021 13:10
54		2	2	3	Leitungsimpedanz	L-N				0,97 Ohm	PSC	237 A AC	01.03.2021 13:10
55		2	2	4	Leitungsimpedanz	L-N				1,03 Ohm	PSC	223 A AC	01.03.2021 13:10
56		2	2	5	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		1,11 Ohm	PEFC	207 A AC	01.03.2021 13:11
57		2	2	6	Leitungsimpedanz	L-N				0,91 Ohm	PSC	254 A AC	01.03.2021 13:14
58		2	2	7	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		0,98 Ohm	PEFC	235 A AC	01.03.2021 13:14
59		2	2	8	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		0,90 Ohm	PEFC	256 A AC	01.03.2021 13:15
60		2	2	9	Leitungsimpedanz	L-N				0,73 Ohm	PSC	316 A AC	01.03.2021 13:15
61		2	2	10	Leitungsimpedanz	L-N				0,81 Ohm	PSC	285 A AC	01.03.2021 13:15
62		2	2	11	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		0,86 Ohm	PEFC	268 A AC	01.03.2021 13:15
63		2	2	12	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		0,96 Ohm	PEFC	241 A AC	01.03.2021 13:15
64		2	2	13	Leitungsimpedanz	L-N				0,83 Ohm	PSC	278 A AC	01.03.2021 13:15
65		2	2	14	Leitungsimpedanz	L-N				0,86 Ohm	PSC	269 A AC	01.03.2021 13:15
66		2	2	15	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		0,95 Ohm	PEFC	243 A AC	01.03.2021 13:15
67		2	2	16	Leitungsimpedanz	L-N				0,87 Ohm	PSC	266 A AC	01.03.2021 13:15
68		2	2	17	Leitungsimpedanz	L-N				0,88 Ohm	PSC	263 A AC	01.03.2021 13:16
69		2	2	18	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		0,91 Ohm	PEFC	254 A AC	01.03.2021 13:16
70		2	2	19	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		0,77 Ohm	PEFC	301 A AC	01.03.2021 13:17
71		2	2	20	Leitungsimpedanz	L-N				0,68 Ohm	PSC	340 A AC	01.03.2021 13:18
72		2	2	21	Leitungsimpedanz	L-N				0,67 Ohm	PSC	346 A AC	01.03.2021 13:18
73		2	2	22	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		0,77 Ohm	PEFC	300 A AC	01.03.2021 13:18
74		2	2	23	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		0,85 Ohm	PEFC	272 A AC	01.03.2021 13:19

Anlageninhaber:	Mag. KAINTZ Dietmar
Anlagenadresse:	7132, Frauenkirchen, Hauptstrasse 12
Überprüfte Anlage	
Anlagenteile:	Gesamte Anlage (Wohnung 1, Wohnung 2, Verkauf, Werks
Messgerät:	FLUKE 1654B V3.14/3.13 2654003

Zu Befund Nr.: PinFrk21015
Ausstelldatum: 15.04.2021

FLUKE MESSUNGEN

	Beschreibung		Ort		Primär	Test-bedingungen				Ergebnisse	Sekundär	Ergebnisse	Zeitstempel
75		2	2	24	Leitungsimpedanz	L-N				0,77 Ohm	PSC	299 A AC	01.03.2021 13:19
	Verteiler												
76	FI 2Q1	2	9999	1	FI-Auslösestrom	30 mA		A	0°	24 mA AC	Fehlspannung	2 V AC	01.03.2021 14:20
77	40/4/0,03 A	2	9999	2	FI-Zeit	30 mA	x1	A	180°	7,2 ms	Fehlspannung	1 V AC	01.03.2021 14:21
78	RISO FI 2Q1	2	9999	3	Isolation				250	2,79 MOhm	Testspannung	260 V DC	01.03.2021 14:21
79	RISO FI 2Q1	2	9999	4	Isolation				250	2,76 MOhm	Testspannung	259 V DC	01.03.2021 14:21
80	RISO FI 2Q1	2	9999	5	Isolation				250	2,78 MOhm	Testspannung	259 V DC	01.03.2021 14:21
81	RISO FI 2Q1	2	9999	6	Isolation				250	2,80 MOhm	Testspannung	259 V DC	01.03.2021 14:21
82	Zuleitung	2	9999	7	Leitungsimpedanz	L-N				0,36 Ohm	PSC	644 A AC	01.03.2021 14:22
83	Zuleitung	2	9999	8	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		0,38 Ohm	PEFC	610 A AC	01.03.2021 14:22
	Hauptverteiler - Gewerbe												
84	Licht	101	7	1	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		0,50 Ohm	PEFC	465 A AC	01.03.2021 13:46
85	Licht	101	7	2	Leitungsimpedanz	L-N				0,38 Ohm	PSC	612 A AC	01.03.2021 13:46
86	Licht	101	7	3	Leitungsimpedanz	L-N				0,56 Ohm	PSC	414 A AC	01.03.2021 13:46
87	Licht	101	7	4	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		0,65 Ohm	PEFC	357 A AC	01.03.2021 13:47
88	Licht	101	7	5	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		0,69 Ohm	PEFC	335 A AC	01.03.2021 13:47
89	Licht	101	7	6	Leitungsimpedanz	L-N				0,61 Ohm	PSC	379 A AC	01.03.2021 13:47
90	Licht	101	7	7	Leitungsimpedanz	L-N				0,53 Ohm	PSC	436 A AC	01.03.2021 13:47
91	Licht	101	7	8	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		0,67 Ohm	PEFC	345 A AC	01.03.2021 13:47
92	Licht	101	7	9	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		0,62 Ohm	PEFC	375 A AC	01.03.2021 13:47
93	Licht	101	7	10	Leitungsimpedanz	L-N				0,58 Ohm	PSC	400 A AC	01.03.2021 13:47
94	Licht	101	7	11	Leitungsimpedanz	L-N				0,55 Ohm	PSC	424 A AC	01.03.2021 13:48
95	Licht	101	7	12	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		0,59 Ohm	PEFC	394 A AC	01.03.2021 13:48
96	Licht	101	7	13	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		0,71 Ohm	PEFC	329 A AC	01.03.2021 13:50
97	Licht	101	7	14	Leitungsimpedanz	L-N				0,65 Ohm	PSC	360 A AC	01.03.2021 13:50
98	Licht	101	7	15	Leitungsimpedanz	L-N				1,02 Ohm	PSC	227 A AC	01.03.2021 13:51
99	Licht	101	7	16	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		1,18 Ohm	PEFC	196 A AC	01.03.2021 13:51
100	Licht	101	7	17	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		1,31 Ohm	PEFC	176 A AC	01.03.2021 13:51
101	Licht	101	7	18	Leitungsimpedanz	L-N				1,02 Ohm	PSC	227 A AC	01.03.2021 13:51

Anlageninhaber:	Mag. KAINTZ Dietmar												
Anlagenadresse:	7132, Frauenkirchen, Hauptstrasse 12										Zu Befund Nr.:	PinFrk21015	
Überprüfte Anlage											Ausstelldatum:	15.04.2021	
Anlagenteile:	Gesamte Anlage (Wohnung 1, Wohnung 2, Verkauf, Werks												
Messgerät:	FLUKE 1654B V3.14/3.13 2654003												

FLUKE MESSUNGEN

	Beschreibung		Ort		Primär	Test-bedingungen				Ergebnisse	Sekundär	Ergebnisse	Zeitstempel
102	Licht	101	7	19	Leitungsimpedanz	L-N				0,91 Ohm	PSC	255 A AC	01.03.2021 13:52
103	Licht	101	7	20	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		1,43 Ohm	PEFC	162 A AC	01.03.2021 13:53
104	Licht	101	7	21	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		0,51 Ohm	PEFC	456 A AC	01.03.2021 13:56
105	Licht	101	7	22	Leitungsimpedanz	L-N				0,39 Ohm	PSC	597 A AC	01.03.2021 13:56
106	Licht 1 St. Neu	101	8	1	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		1,15 Ohm	PEFC	200 A AC	01.03.2021 13:38
107	Licht 1 St. Neu	101	8	2	Leitungsimpedanz	L-N				0,90 Ohm	PSC	256 A AC	01.03.2021 13:38
108	Licht 1 St. Neu	101	8	3	Leitungsimpedanz	L-N				1,68 Ohm	PSC	138 A AC	01.03.2021 13:41
109	Licht 1 St. Neu	101	8	4	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		2,86 Ohm	PEFC	81 A AC	01.03.2021 13:41
110	Licht 1 St. Neu	101	8	5	Leitungsimpedanz	L-N				0,66 Ohm	PSC	352 A AC	01.03.2021 13:44
111	Licht 1 St. Neu	101	8	6	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		0,82 Ohm	PEFC	283 A AC	01.03.2021 13:44
112	Licht Keller Lag.	101	9	1	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		0,68 Ohm	PEFC	343 A AC	01.03.2021 13:36
113	Licht Keller Lag.	101	9	2	Leitungsimpedanz	L-N				0,61 Ohm	PSC	381 A AC	01.03.2021 13:36
114	Licht Keller Lag.	101	9	3	Leitungsimpedanz	L-N				0,63 Ohm	PSC	369 A AC	01.03.2021 13:36
115	Licht Keller Lag.	101	9	4	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		0,75 Ohm	PEFC	310 A AC	01.03.2021 13:36
116	Licht Keller Lag.	101	9	5	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		2,67 Ohm	PEFC	87 A AC	01.03.2021 13:42
117	Licht Keller Lag.	101	9	6	Leitungsimpedanz	L-N				1,57 Ohm	PSC	148 A AC	01.03.2021 13:42
118	Zuleitung	101	9999	1	Leitungsimpedanz	L-N				0,38 Ohm	PSC	606 A AC	01.03.2021 14:17
119	Zuleitung	101	9999	2	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		0,40 Ohm	PEFC	578 A AC	01.03.2021 14:18
120	FI 3Q1	101	9999	3	FI-Zeit	30 mA	x1	A	180°	7,4 ms	Fehlspannung	0 V AC	01.03.2021 14:18
121	40/4/0,03 A	101	9999	4	FI-Auslösestrom	30 mA		A	0°	24 mA AC	Fehlspannung	0 V AC	01.03.2021 14:18
122	RISO FI 3Q1	101	9999	5	Isolation				250	50,4 MOhm	Testspannung	260 V DC	01.03.2021 14:18
123	RISO FI 3Q1	101	9999	6	Isolation				250	59,2 MOhm	Testspannung	260 V DC	01.03.2021 14:18
124	RISO FI 3Q1	101	9999	7	Isolation				250	51,9 MOhm	Testspannung	260 V DC	01.03.2021 14:19
125	RISO FI 3Q1	101	9999	8	Isolation				250	52,1 MOhm	Testspannung	260 V DC	01.03.2021 14:19
	Appartement (Wohnung Hinten) - UV 1												
	Schuko Esszimmer + Küche												
126	SSD	1001	1	1	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		0,65 Ohm	PEFC	360 A AC	01.03.2021 10:27
127	SSD	1001	1	2	Leitungsimpedanz	L-N				0,59 Ohm	PSC	397 A AC	01.03.2021 10:27
128	SSD	1001	1	3	Leitungsimpedanz	L-N				0,57 Ohm	PSC	411 A AC	01.03.2021 10:27

Anlageninhaber:	Mag. KAINTZ Dietmar
Anlagenadresse:	7132, Frauenkirchen, Hauptstrasse 12
Überprüfte Anlage	
Anlagenteile:	Gesamte Anlage (Wohnung 1, Wohnung 2, Verkauf, Werks
Messgerät:	FLUKE 1654B V3.14/3.13 2654003

Zu Befund Nr.: PinFrk21015
Ausstelldatum: 15.04.2021

FLUKE MESSUNGEN

	Beschreibung		Ort		Primär	Test-bedingungen				Ergebnisse	Sekundär	Ergebnisse	Zeitstempel
129	SSD	1001	1	4	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		0,62 Ohm	PEFC	378 A AC	01.03.2021 10:27
130	SSD	1001	1	5	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		0,67 Ohm	PEFC	350 A AC	01.03.2021 10:27
131	SSD	1001	1	6	Leitungsimpedanz	L-N				0,64 Ohm	PSC	367 A AC	01.03.2021 10:27
132	SSD	1001	1	7	Leitungsimpedanz	L-N				0,62 Ohm	PSC	378 A AC	01.03.2021 10:27
133	SSD	1001	1	8	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		0,67 Ohm	PEFC	350 A AC	01.03.2021 10:27
134	SSD	1001	1	9	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		0,67 Ohm	PEFC	349 A AC	01.03.2021 10:28
135	SSD	1001	1	10	Leitungsimpedanz	L-N				0,59 Ohm	PSC	396 A AC	01.03.2021 10:28
136	SSD	1001	1	11	Leitungsimpedanz	L-N				0,60 Ohm	PSC	389 A AC	01.03.2021 10:28
137	SSD	1001	1	12	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		0,67 Ohm	PEFC	348 A AC	01.03.2021 10:28
138	SSD	1001	1	13	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		0,78 Ohm	PEFC	299 A AC	01.03.2021 10:29
139	SSD	1001	1	14	Leitungsimpedanz	L-N				0,76 Ohm	PSC	308 A AC	01.03.2021 10:29
140	SSD	1001	1	15	Leitungsimpedanz	L-N				0,78 Ohm	PSC	300 A AC	01.03.2021 10:29
141	SSD	1001	1	16	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		0,82 Ohm	PEFC	286 A AC	01.03.2021 10:29
142	SSD	1001	1	17	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		0,93 Ohm	PEFC	251 A AC	01.03.2021 10:29
143	SSD	1001	1	18	Leitungsimpedanz	L-N				0,89 Ohm	PSC	263 A AC	01.03.2021 10:29
144	SSD	1001	1	19	Leitungsimpedanz	L-N				0,78 Ohm	PSC	299 A AC	01.03.2021 10:29
145	SSD	1001	1	20	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		0,86 Ohm	PEFC	272 A AC	01.03.2021 10:30
	Schuko Küche + Bad + Backrohr												
146	SSD	1001	2	1	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		1,03 Ohm	PEFC	227 A AC	01.03.2021 10:25
147	SSD	1001	2	2	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		0,67 Ohm	PEFC	351 A AC	01.03.2021 10:31
148	SSD	1001	2	3	Leitungsimpedanz	L-N				0,59 Ohm	PSC	398 A AC	01.03.2021 10:31
149	SSD	1001	2	4	Leitungsimpedanz	L-N				0,58 Ohm	PSC	405 A AC	01.03.2021 10:31
150	SSD	1001	2	5	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		0,63 Ohm	PEFC	373 A AC	01.03.2021 10:31
151	SSD	1001	2	6	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		0,76 Ohm	PEFC	310 A AC	01.03.2021 10:31
152	SSD	1001	2	7	Leitungsimpedanz	L-N				0,65 Ohm	PSC	362 A AC	01.03.2021 10:31
153	SSD	1001	2	8	Leitungsimpedanz	L-N				0,62 Ohm	PSC	380 A AC	01.03.2021 10:31
154	SSD	1001	2	9	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		0,70 Ohm	PEFC	336 A AC	01.03.2021 10:32
155	SSD	1001	2	10	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		0,72 Ohm	PEFC	327 A AC	01.03.2021 10:32
156	SSD	1001	2	11	Leitungsimpedanz	L-N				0,59 Ohm	PSC	399 A AC	01.03.2021 10:32

Anlageninhaber:	Mag. KAINTZ Dietmar		
Anlagenadresse:	7132, Frauenkirchen, Hauptstrasse 12	Zu Befund Nr.:	PinFrk21015
Überprüfte Anlage		Ausstelldatum:	15.04.2021
Anlagenteile:	Gesamte Anlage (Wohnung 1, Wohnung 2, Verkauf, Werks		
Messgerät:	FLUKE 1654B V3.14/3.13 2654003		

FLUKE MESSUNGEN

	Beschreibung		Ort		Primär	Test-bedingungen				Ergebnisse	Sekundär	Ergebnisse	Zeitstempel
157	SSD	1001	2	12	Leitungsimpedanz	L-N				0,60 Ohm	PSC	391 A AC	01.03.2021 10:32
158	SSD	1001	2	13	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		0,67 Ohm	PEFC	350 A AC	01.03.2021 10:32
159	SSD	1001	2	14	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		0,86 Ohm	PEFC	273 A AC	01.03.2021 10:32
160	SSD	1001	2	15	Leitungsimpedanz	L-N				0,71 Ohm	PSC	331 A AC	01.03.2021 10:33
161	SSD	1001	2	16	Leitungsimpedanz	L-N				0,70 Ohm	PSC	335 A AC	01.03.2021 10:33
162	SSD	1001	2	17	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		0,77 Ohm	PEFC	305 A AC	01.03.2021 10:33
163	SSD	1001	2	18	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		0,70 Ohm	PEFC	336 A AC	01.03.2021 10:33
164	SSD	1001	2	19	Leitungsimpedanz	L-N				0,55 Ohm	PSC	426 A AC	01.03.2021 10:33
165	SSD	1001	2	20	Leitungsimpedanz	L-N				0,67 Ohm	PSC	350 A AC	01.03.2021 10:33
166	SSD	1001	2	21	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		0,80 Ohm	PEFC	293 A AC	01.03.2021 10:33
	Schuko Schlafzimmer + Kinderzimmer												
167	SSD	1001	3	1	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		1,03 Ohm	PEFC	227 A AC	01.03.2021 10:25
168	SSD	1001	3	2	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		0,73 Ohm	PEFC	319 A AC	01.03.2021 10:43
169	SSD	1001	3	3	Leitungsimpedanz	L-N				0,65 Ohm	PSC	358 A AC	01.03.2021 10:43
170	SSD	1001	3	4	Leitungsimpedanz	L-N				0,73 Ohm	PSC	319 A AC	01.03.2021 10:43
171	SSD	1001	3	5	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		0,86 Ohm	PEFC	270 A AC	01.03.2021 10:43
172	SSD	1001	3	6	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		0,90 Ohm	PEFC	259 A AC	01.03.2021 10:44
173	SSD	1001	3	7	Leitungsimpedanz	L-N				0,74 Ohm	PSC	315 A AC	01.03.2021 10:44
174	SSD	1001	3	8	Leitungsimpedanz	L-N				0,80 Ohm	PSC	290 A AC	01.03.2021 10:45
175	SSD	1001	3	9	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		0,92 Ohm	PEFC	253 A AC	01.03.2021 10:45
176	SSD	1001	3	10	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		0,94 Ohm	PEFC	247 A AC	01.03.2021 10:45
177	SSD	1001	3	11	Leitungsimpedanz	L-N				0,79 Ohm	PSC	293 A AC	01.03.2021 10:45
178	SSD	1001	3	12	Leitungsimpedanz	L-N				0,64 Ohm	PSC	363 A AC	01.03.2021 10:46
179	SSD	1001	3	13	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		0,75 Ohm	PEFC	309 A AC	01.03.2021 10:46
180	SSD	1001	3	14	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		0,81 Ohm	PEFC	287 A AC	01.03.2021 10:46
181	SSD	1001	3	15	Leitungsimpedanz	L-N				0,69 Ohm	PSC	337 A AC	01.03.2021 10:47
182	SSD	1001	3	16	Leitungsimpedanz	L-N				0,68 Ohm	PSC	342 A AC	01.03.2021 10:47
183	SSD	1001	3	17	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		0,77 Ohm	PEFC	302 A AC	01.03.2021 10:47
184	SSD	1001	3	18	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		0,87 Ohm	PEFC	267 A AC	01.03.2021 10:47

Anlageninhaber:	Mag. KAINTZ Dietmar
Anlagenadresse:	7132, Frauenkirchen, Hauptstrasse 12
Überprüfte Anlage Anlagenteile:	Gesamte Anlage (Wohnung 1, Wohnung 2, Verkauf, Werks
Messgerät:	FLUKE 1654B V3.14/3.13 2654003

Zu Befund Nr.: PinFrk21015
Ausstelldatum: 15.04.2021

FLUKE MESSUNGEN

	Beschreibung		Ort		Primär	Test-bedingungen				Ergebnisse	Sekundär	Ergebnisse	Zeitstempel
185	SSD	1001	3	19	Leitungsimpedanz	L-N				0,76 Ohm	PSC	305 A AC	01.03.2021 10:47
186	SSD	1001	3	20	Leitungsimpedanz	L-N				0,75 Ohm	PSC	309 A AC	01.03.2021 10:47
187	SSD	1001	3	21	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		0,85 Ohm	PEFC	273 A AC	01.03.2021 10:47
	Schuko Wohnzimmer + Arbeitsraum												
188	SSD	1001	4	1	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		0,90 Ohm	PEFC	260 A AC	01.03.2021 10:49
189	SSD	1001	4	2	Leitungsimpedanz	L-N				0,74 Ohm	PSC	315 A AC	01.03.2021 10:50
190	SSD	1001	4	3	Leitungsimpedanz	L-N				0,85 Ohm	PSC	274 A AC	01.03.2021 10:50
191	SSD	1001	4	4	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		0,92 Ohm	PEFC	253 A AC	01.03.2021 10:50
192	SSD	1001	4	5	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		1,08 Ohm	PEFC	217 A AC	01.03.2021 10:50
193	SSD	1001	4	6	Leitungsimpedanz	L-N				0,89 Ohm	PSC	263 A AC	01.03.2021 10:50
194	SSD	1001	4	7	Leitungsimpedanz	L-N				0,47 Ohm	PSC	498 A AC	01.03.2021 10:50
195	SSD	1001	4	8	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		1,00 Ohm	PEFC	234 A AC	01.03.2021 10:51
196	SSD	1001	4	9	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		0,66 Ohm	PEFC	356 A AC	01.03.2021 10:51
197	SSD	1001	4	10	Leitungsimpedanz	L-N				0,54 Ohm	PSC	435 A AC	01.03.2021 10:51
198	SSD	1001	4	11	Leitungsimpedanz	L-N				0,53 Ohm	PSC	443 A AC	01.03.2021 10:51
199	SSD	1001	4	12	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		0,68 Ohm	PEFC	345 A AC	01.03.2021 10:51
200	SSD	1001	4	13	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		0,70 Ohm	PEFC	334 A AC	01.03.2021 10:52
201	SSD	1001	4	14	Leitungsimpedanz	L-N				0,59 Ohm	PSC	396 A AC	01.03.2021 10:52
202	SSD	1001	4	15	Leitungsimpedanz	L-N				0,55 Ohm	PSC	424 A AC	01.03.2021 10:52
203	SSD	1001	4	16	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		0,64 Ohm	PEFC	365 A AC	01.03.2021 10:52
204	SSD	1001	4	17	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		0,57 Ohm	PEFC	410 A AC	01.03.2021 10:52
205	SSD	1001	4	18	Leitungsimpedanz	L-N				0,46 Ohm	PSC	509 A AC	01.03.2021 10:52
	Schuko Antennenverstärker												
206	SSD	1001	5	1	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		1,18 Ohm	PEFC	196 A AC	01.03.2021 11:21
207	SSD	1001	5	2	Leitungsimpedanz	L-N				1,00 Ohm	PSC	232 A AC	01.03.2021 11:21
208	SSD	1001	5	3	Leitungsimpedanz	L-N				0,94 Ohm	PSC	246 A AC	01.03.2021 11:21
209	SSD	1001	5	4	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		1,09 Ohm	PEFC	213 A AC	01.03.2021 11:21
	Licht Hinten												
210	SSD	1001	6	1	Leitungsimpedanz	L-N				0,64 Ohm	PSC	364 A AC	01.03.2021 10:53

Anlageninhaber:	Mag. KAINTZ Dietmar
Anlagenadresse:	7132, Frauenkirchen, Hauptstrasse 12
Überprüfte Anlage Anlagenteile:	Gesamte Anlage (Wohnung 1, Wohnung 2, Verkauf, Werks
Messgerät:	FLUKE 1654B V3.14/3.13 2654003

Zu Befund Nr.: PinFrk21015
Ausstelldatum: 15.04.2021

FLUKE MESSUNGEN

	Beschreibung		Ort		Primär	Test-bedingungen				Ergebnisse	Sekundär	Ergebnisse	Zeitstempel
211	SSD	1001	6	2	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		0,79 Ohm	PEFC	295 A AC	01.03.2021 10:53
212	SSD	1001	6	3	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		0,59 Ohm	PEFC	398 A AC	01.03.2021 10:54
213	SSD	1001	6	4	Leitungsimpedanz	L-N				0,52 Ohm	PSC	451 A AC	01.03.2021 10:54
214	SSD	1001	6	5	Leitungsimpedanz	L-N				0,81 Ohm	PSC	289 A AC	01.03.2021 10:54
215	SSD	1001	6	6	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		0,93 Ohm	PEFC	252 A AC	01.03.2021 10:54
216	SSD	1001	6	7	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		0,92 Ohm	PEFC	255 A AC	01.03.2021 10:55
217	SSD	1001	6	8	Leitungsimpedanz	L-N				0,78 Ohm	PSC	301 A AC	01.03.2021 10:55
218	SSD	1001	6	9	Leitungsimpedanz	L-N				0,84 Ohm	PSC	279 A AC	01.03.2021 10:55
219	SSD	1001	6	10	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		0,98 Ohm	PEFC	239 A AC	01.03.2021 10:55
220	SSD	1001	6	11	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		1,13 Ohm	PEFC	207 A AC	01.03.2021 10:56
221	SSD	1001	6	12	Leitungsimpedanz	L-N				0,96 Ohm	PSC	244 A AC	01.03.2021 10:56
222	SSD	1001	6	13	Leitungsimpedanz	L-N				1,03 Ohm	PSC	228 A AC	01.03.2021 10:56
223	SSD	1001	6	14	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		1,11 Ohm	PEFC	211 A AC	01.03.2021 10:56
224	SSD	1001	6	15	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		1,18 Ohm	PEFC	199 A AC	01.03.2021 10:56
225	SSD	1001	6	16	Leitungsimpedanz	L-N				1,08 Ohm	PSC	217 A AC	01.03.2021 10:56
226	SSD	1001	6	17	Leitungsimpedanz	L-N				1,06 Ohm	PSC	221 A AC	01.03.2021 10:57
227	SSD	1001	6	18	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		1,74 Ohm	PEFC	135 A AC	01.03.2021 10:57
228	SSD	1001	6	19	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		1,14 Ohm	PEFC	206 A AC	01.03.2021 10:57
229	SSD	1001	6	20	Leitungsimpedanz	L-N				0,99 Ohm	PSC	237 A AC	01.03.2021 10:57
	Licht Vorne												
230	SSD	1001	7	1	Leitungsimpedanz	L-N				1,04 Ohm	PSC	224 A AC	01.03.2021 11:02
231	SSD	1001	7	2	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		1,08 Ohm	PEFC	216 A AC	01.03.2021 11:02
232	SSD	1001	7	3	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		0,91 Ohm	PEFC	256 A AC	01.03.2021 11:03
233	SSD	1001	7	4	Leitungsimpedanz	L-N				0,76 Ohm	PSC	306 A AC	01.03.2021 11:03
234	SSD	1001	7	5	Leitungsimpedanz	L-N				0,75 Ohm	PSC	311 A AC	01.03.2021 11:03
235	SSD	1001	7	6	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		0,87 Ohm	PEFC	268 A AC	01.03.2021 11:03
236	SSD	1001	7	7	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		1,34 Ohm	PEFC	174 A AC	01.03.2021 11:04
237	SSD	1001	7	8	Leitungsimpedanz	L-N				0,88 Ohm	PSC	266 A AC	01.03.2021 11:04
238	FI Q1 - UV 1	1001	9999	1	FI-Zeit	30 mA	x1	A	180°	6,8 ms	Fehlspannung	0 V AC	01.03.2021 10:10

Anlageninhaber:	Mag. KAINTZ Dietmar		
Anlagenadresse:	7132, Frauenkirchen, Hauptstrasse 12	Zu Befund Nr.:	PinFrk21015
Überprüfte Anlage		Ausstelldatum:	15.04.2021
Anlagenteile:	Gesamte Anlage (Wohnung 1, Wohnung 2, Verkauf, Werks		
Messgerät:	FLUKE 1654B V3.14/3.13 2654003		

FLUKE MESSUNGEN

	Beschreibung		Ort		Primär	Test-bedingungen				Ergebnisse	Sekundär	Ergebnisse	Zeitstempel
239	40/4/0,03	1001	9999	2	FI-Auslösestrom	30 mA		A	0°	21 mA AC	Fehlspannung	0 V AC	01.03.2021 10:10
240	RISO	1001	9999	3	Isolation				250	>200,0 MOhm	Testspannung	261 V DC	01.03.2021 10:10
241	RISO	1001	9999	4	Isolation				250	>200,0 MOhm	Testspannung	261 V DC	01.03.2021 10:11
242	RISO	1001	9999	5	Isolation				250	1,66 MOhm	Testspannung	259 V DC	01.03.2021 10:11
243	RISO	1001	9999	6	Isolation				250	3,25 MOhm	Testspannung	260 V DC	01.03.2021 10:11
244	RISO	1001	9999	7	Isolation				250	>200,0 MOhm	Testspannung	261 V DC	01.03.2021 10:12
245	RISO	1001	9999	8	Isolation				250	>200,0 MOhm	Testspannung	261 V DC	01.03.2021 10:12
246	RISO	1001	9999	9	Isolation				250	40,2 MOhm	Testspannung	261 V DC	01.03.2021 10:12
247	Zuleitung	1001	9999	10	Leitungsimpedanz	L-N				0,44 Ohm	PSC	532 A AC	01.03.2021 10:17
248	Zuleitung	1001	9999	11	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		0,55 Ohm	PEFC	427 A AC	01.03.2021 10:17
	Appartement (Wohnung Hinten) - UV 2												
249	E-Herd	2001	1	1	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		0,95 Ohm	PEFC	246 A AC	01.03.2021 10:22
250	Waschm.	2001	2	1	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		0,78 Ohm	PEFC	299 A AC	01.03.2021 10:22
251	Waschm.	2001	2	2	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		1,15 Ohm	PEFC	204 A AC	01.03.2021 10:35
252	Waschm.	2001	2	3	Leitungsimpedanz	L-N				1,06 Ohm	PSC	222 A AC	01.03.2021 10:35
253	Waschm.	2001	2	4	Leitungsimpedanz	L-N				1,08 Ohm	PSC	217 A AC	01.03.2021 10:36
254	Waschm.	2001	2	5	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		1,16 Ohm	PEFC	203 A AC	01.03.2021 10:36
255	Waschm.	2001	2	6	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		0,71 Ohm	PEFC	328 A AC	01.03.2021 10:41
256	Waschm.	2001	2	7	Leitungsimpedanz	L-N				0,62 Ohm	PSC	376 A AC	01.03.2021 10:41
257	GSP	2001	3	1	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		0,78 Ohm	PEFC	299 A AC	01.03.2021 10:23
258	TR	2001	5	1	Leitungsimpedanz	L-N				0,61 Ohm	PSC	382 A AC	01.03.2021 10:41
259	TR	2001	5	2	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		0,73 Ohm	PEFC	319 A AC	01.03.2021 10:42
260	Konv. Bad	2001	6	1	Leitungsimpedanz	L-N				0,54 Ohm	PSC	432 A AC	01.03.2021 11:05
261	Konv. Bad	2001	6	2	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		0,64 Ohm	PEFC	365 A AC	01.03.2021 11:05
262	Gastherme	2001	7	1	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		0,61 Ohm	PEFC	383 A AC	01.03.2021 11:05
263	FI Q1 - UV 2	2001	9999	1	FI-Zeit	30 mA	x1	A	180°	7,2 ms	Fehlspannung	0 V AC	01.03.2021 10:15
264	40/4/0,03	2001	9999	2	FI-Auslösestrom	30 mA		A	0°	24 mA AC	Fehlspannung	0 V AC	01.03.2021 10:15
265	RISO	2001	9999	3	Isolation				250	>200,0 MOhm	Testspannung	261 V DC	01.03.2021 10:16
266	RISO	2001	9999	4	Isolation				250	>200,0 MOhm	Testspannung	261 V DC	01.03.2021 10:16

Anlageninhaber:	Mag. KAINTZ Dietmar		
Anlagenadresse:	7132, Frauenkirchen, Hauptstrasse 12	Zu Befund Nr.:	PinFrk21015
Überprüfte Anlage		Ausstelldatum:	15.04.2021
Anlagenteile:	Gesamte Anlage (Wohnung 1, Wohnung 2, Verkauf, Werks		
Messgerät:	FLUKE 1654B V3.14/3.13 2654003		

FLUKE MESSUNGEN

	Beschreibung		Ort		Primär	Test-bedingungen				Ergebnisse	Sekundär	Ergebnisse	Zeitstempel
267	RISO	2001	9999	5	Isolation				250	>200,0 MOhm	Testspannung	261 V DC	01.03.2021 10:16
268	RISO	2001	9999	6	Isolation				250	>200,0 MOhm	Testspannung	261 V DC	01.03.2021 10:16
269	Zuleitung	2001	9999	7	Schleifenimpedanz	L-PE		PEFC		0,53 Ohm	PEFC	442 A AC	01.03.2021 10:16
270	Zuleitung	2001	9999	8	Leitungsimpedanz	L-N				0,44 Ohm	PSC	535 A AC	01.03.2021 10:16

Anlageninhaber: Mag. KAINTZ Dietmar
Anlagenadresse: 7132, Frauenkirchen, Hauptstrasse 12
Überprüfte Anlage
Anlagenteile: Gesamte Anlage (Wohnung 1, Wohnung 2, Verkauf, Werkstatt,

Zu Befund Nr.: PinFrk21015
Ausstelldatum: 15.04.2021

Raum Nr.	Besichtigung	Mängel	Messungen	behoben am	durch Monteur
		keine Mängel			
